


【区・市・町】 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書

市区町村:		担当課:		担当者:		整理No:	
				受付処理日	年	月	日
施主様	しずおか しずお 様		工事名称	しずおかしずお様邸 屋根葺き替え工事			
提出年月日	2021	年	8	月	20	日	現場住所 〒 静岡県静岡市駿河区2丁目2-2
施主様連絡先	TEL:		工事期間	8 / 1 ~ 8 / 15			
施工部材	商品名:種類			メーカー名		色等	
瓦	5 3A 削ぎ椀瓦 J型			静岡瓦産業		いぶし	
下葺き材	ゴムアスファルトルーフィング			しずるーふ			
施工会社	静岡瓦工事			代表者名: しずおか かわらたろう			
住所	〒 123-4567 静岡県静岡市駿河区1丁目1-1						
連絡先	TEL: 012-345-6789			Mail: info@shizuoka-kawara.jp			
施工責任者	やね ふきたろう			瓦屋根診断技士		資格登録 No: 00-0000-00-00-0	
				氏名: やね ふきたろう			
No	施工部位	部材・仕様					
0	基礎情報	<input checked="" type="checkbox"/> 屋根勾配:( 4.5 寸) <input checked="" type="checkbox"/> 屋根面積:( 93.48 m <sup>2</sup> ) <input checked="" type="checkbox"/> 屋根形状:( 切妻屋根 )					
1	下地	<input type="checkbox"/> 構造用合板( mm) <input type="checkbox"/> 野地板( 13.5 mm) <input type="checkbox"/> その他( )					
2	防水紙	<input type="checkbox"/> ルーフィング940 <input checked="" type="checkbox"/> ゴムアスルーフィング( ) <input type="checkbox"/> 通気シート( ) <input type="checkbox"/> その他( )					
		<input type="checkbox"/> 一重張り <input checked="" type="checkbox"/> 二重張り <input type="checkbox"/> ホールレス工法( ) <input type="checkbox"/> その他( )					
3	流し椀	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> ベニヤ( 2.7mm× 36 mm) <input type="checkbox"/> PCキズリ( mm× mm) <input type="checkbox"/> その他(種類 mm)					
		<input checked="" type="checkbox"/> 杉 <input type="checkbox"/> 桧 <input type="checkbox"/> 松 <input type="checkbox"/> 人工木 サイズ: 24mm× 30 mm <input type="checkbox"/> 水抜き加工 防腐処理 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無( )					
	縦椀	<input type="checkbox"/> ビス(種類 / mm) <input checked="" type="checkbox"/> 釘(種類 リング / 65 mm) <input type="checkbox"/> その他(種類 / mm)					
		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 杉 <input type="checkbox"/> 桧 <input type="checkbox"/> 松 <input type="checkbox"/> 人工 サイズ: 15mm× 30 mm 防腐処理 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無( )					
4	平部施行	<input checked="" type="checkbox"/> 全数緊結 <input type="checkbox"/> 緊結材: <input type="checkbox"/> 釘( mm) <input checked="" type="checkbox"/> ステンビス( 51 mm) <input type="checkbox"/> その他(種類 mm)					
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 雪止め瓦 <input type="checkbox"/> 雪止め金具 <input type="checkbox"/> その他( ) (設置方法)					
5	軒先部:3点緊結	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> GLカラー <input type="checkbox"/> プラスチック <input type="checkbox"/> 人工木 <input type="checkbox"/> その他( )					
		<input type="checkbox"/> 緊結材: <input type="checkbox"/> ステンリング釘 <input checked="" type="checkbox"/> ステンビス( 51mm+ 57 mm) <input type="checkbox"/> 7釘( mm) <input checked="" type="checkbox"/> P付きビス( 105 mm) <input type="checkbox"/> その他( )					
6	袖部:3点緊結	<input type="checkbox"/> 緊結材: <input type="checkbox"/> ステンリング釘 <input checked="" type="checkbox"/> ステンビス( 51mm+ 57 mm) <input type="checkbox"/> 7釘( mm) <input checked="" type="checkbox"/> P付きビス( 95 mm) <input type="checkbox"/> その他( )					
		<input type="checkbox"/> 強力棟金具( mm@ ) <input checked="" type="checkbox"/> アンカーボルト( 450 mm@ 910 ) (パイ 9 mm) <input type="checkbox"/> 箱棟					
7	棟部	<input checked="" type="checkbox"/> 横筋ステンレス <input type="checkbox"/> 亜鉛溝付け <input type="checkbox"/> 鉄筋 <input type="checkbox"/> パイ( 9 mm)					
		<input checked="" type="checkbox"/> 南蛮漆喰( 静岡南蛮 ) <input type="checkbox"/> 葺き土 <input type="checkbox"/> モルタル <input type="checkbox"/> 乾式( )					
		<input checked="" type="checkbox"/> 棟段数( 陸棟 <input type="checkbox"/> 2F: 段 <input checked="" type="checkbox"/> 1F: 5段 <input type="checkbox"/> 3F: 段 緊結法・材( ホルマル銅線相互緊結 )					
		<input type="checkbox"/> 強力棟金具( ) <input checked="" type="checkbox"/> アンカーボルト(パイ 9mm×高さ 450 mm) <input checked="" type="checkbox"/> 横筋 3 段 5 本 パイ 9 mm					
		<input type="checkbox"/> 棟段数( 隅棟 <input type="checkbox"/> 2F: 段 <input type="checkbox"/> 1F: 段 <input type="checkbox"/> 3F: 段 緊結法・材( )					
		<input type="checkbox"/> 強力棟金具( ) <input type="checkbox"/> アンカーボルト(パイ mm×高さ mm) <input type="checkbox"/> 横筋 段 本 パイ mm					
8	壁取合部	<input type="checkbox"/> 水平壁際: <input type="checkbox"/> のし積み: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無( 段) 緊結法・材( )					
		<input type="checkbox"/> 流れ壁際: <input type="checkbox"/> のし積み: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無( 段) 緊結法・材( )					
		<input type="checkbox"/> 捨て水切り: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> GLカラー <input type="checkbox"/> カラーステン 雨押え水切り: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無( )					
9	谷部	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> GLカラー <input type="checkbox"/> カラーステン <input type="checkbox"/> シーラー( mm× mm) <input type="checkbox"/> 防水紙二重敷: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
10	その他						

※詳細に付いては、2021年改訂版【瓦屋根標準設計・施工ガイドライン】参照

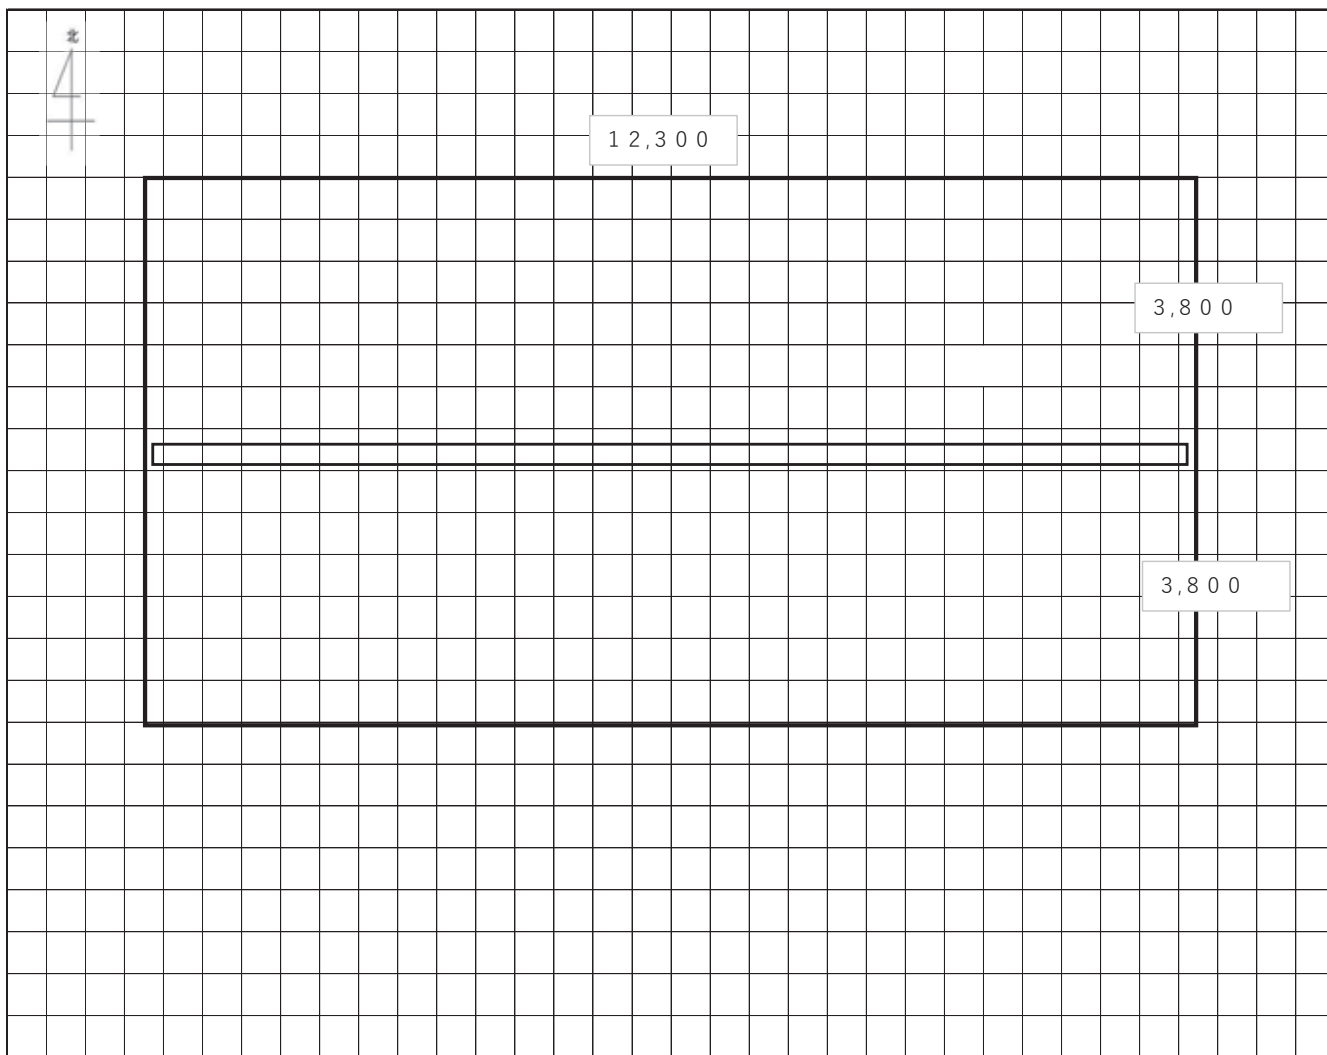

No	部位
0	既存
撮影日	2021年8月1日
<ul style="list-style-type: none"> <li>・瓦：いぶし瓦</li> <li>・土葺き工法</li> <li>・4.5分野地板 杉皮</li> </ul>	



「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書：施工


No	部位
1~2	防水紙
撮影日	2021年8月1日
1：野地板 2：ゴムアスルーフィング 二重敷 3：上下450mm左右300mm	



No	部位
2	防水紙
撮影日	2021年8月2日
1：ゴムアスルーフィング 二重敷	




No	部位
3	縦棧木
撮影日	2021年8月3日
1：流し棧カットベニア2.7mm 2：横棧木 杉24mm×30mm	

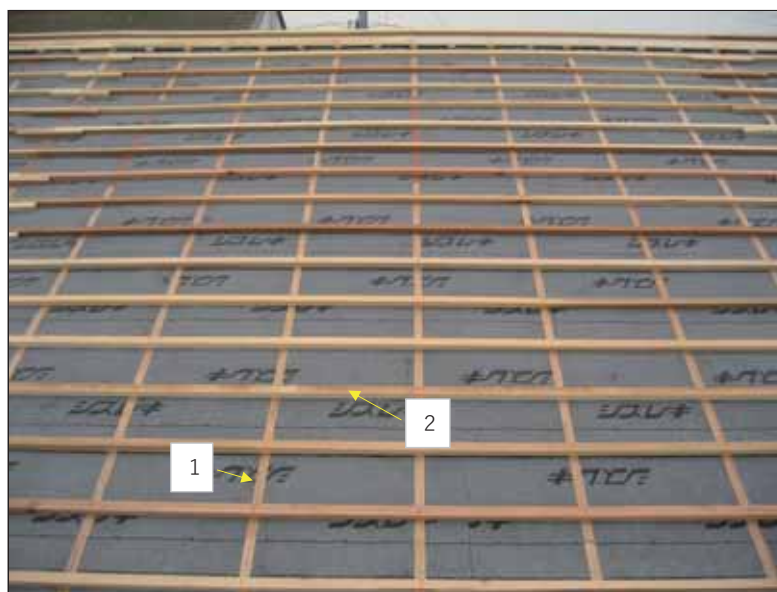

「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書：施工


No	部位
3	縦椽木
撮影日	2021年8月4日
1：縦椽木 杉 15mm×30mm	

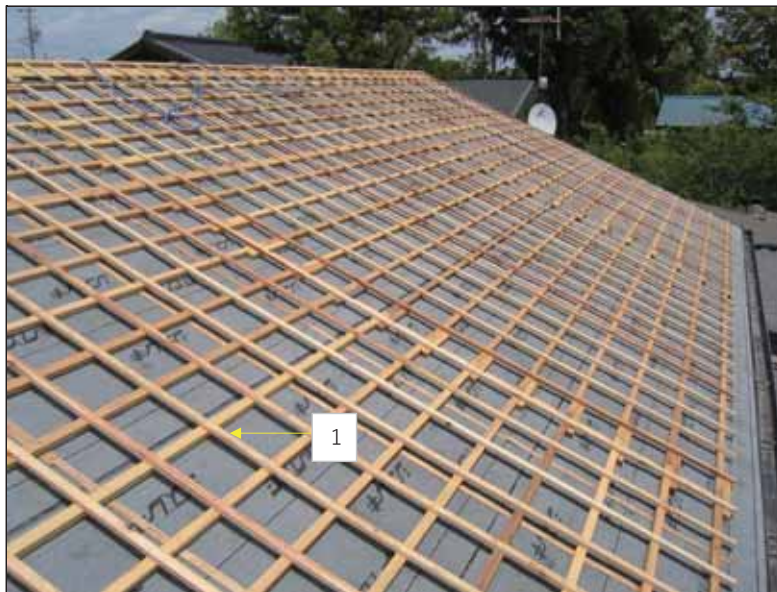

No	部位
4	平部施行
撮影日	2021年8月5日
1：平部 51mmステンレスビス 全数緊結	



No	部位
5	軒先部施行
撮影日	2021年8月7日
軒瓦 1：棧山105mmP付ステンビス 2：棧側57mmステンビス 3：差し込み側51mmステンビス	

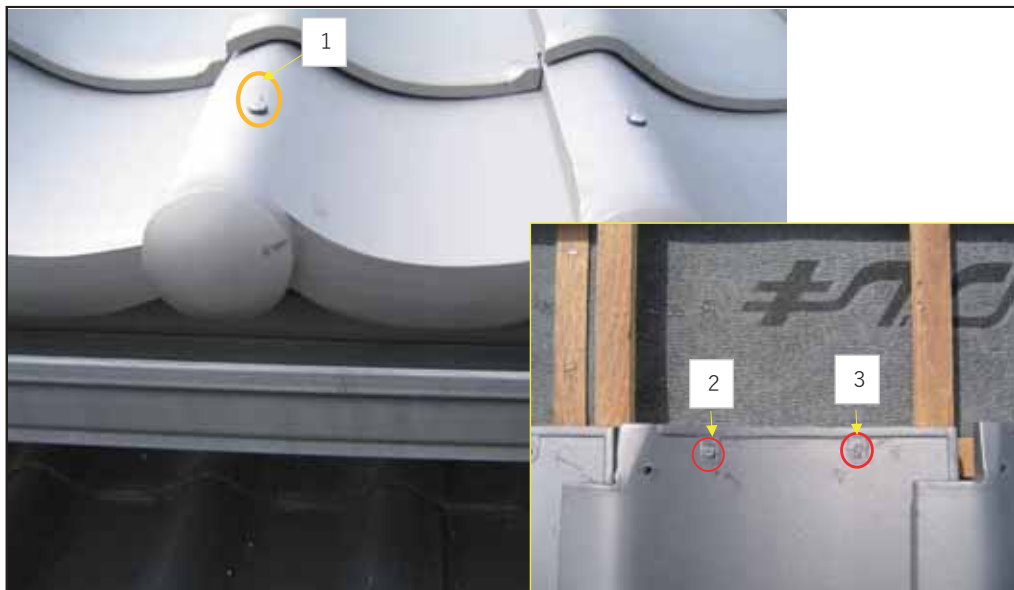

「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書：施工

No	部位
6	袖部
撮影日	2021年8月8日
袖瓦 1：尻部51mmステンビス 2：手先90mmP付ステンビス	



No	部位
7	棟部
撮影日	2021年8月8日
1：ステンレスアンカーボルト 12mm×300mm	



No	部位
7	棟部
撮影日	2021年8月8日
1：横筋 ステンレス9パイ 3段 5本設置	



「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書：施工

No	部位
0	竣工
撮影日	2021年8月8日



No	部位
撮影日	年 月 日



No	部位
撮影日	年 月 日



「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書：施工

No	部位
撮影日	年 月 日

--	--

No	部位
撮影日	年 月 日

--	--

No	部位
撮影日	年 月 日

--	--

「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」対応工法施工証明書：施工

No	部位
撮影日	年 月 日

No	部位
撮影日	年 月 日

No	部位
撮影日	年 月 日
